


متابعة أعمال بناء مشروع ربي مكة

مارس ٢٠٢٠

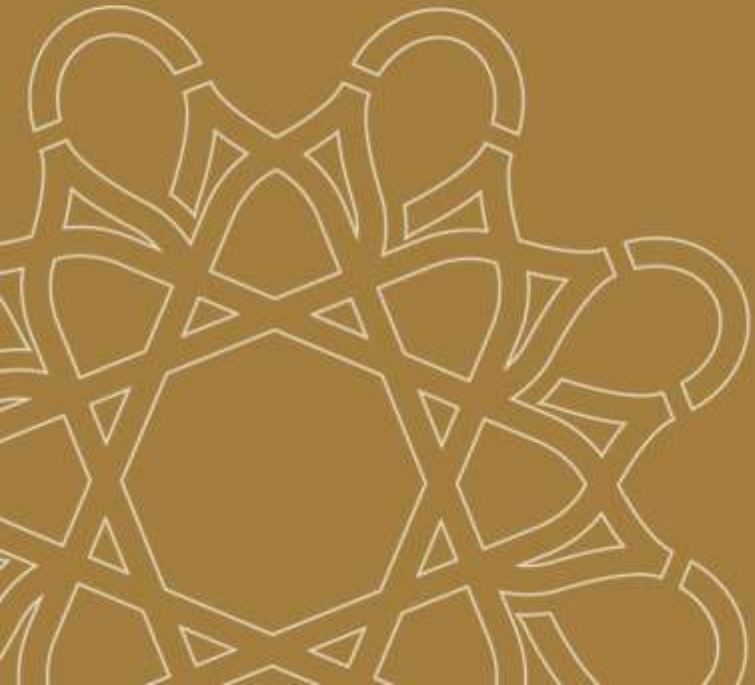

١- ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى حتى تاريخه :

١. الإنتهاء من جميع أعمال الحفر.
٢. الإنتهاء من أعمال الخرسانة العادية أسفل اللبشة المسلحة.
٣. الإنتهاء من أعمال العزل المائي للأساسات.
٤. تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة للبشة الخزان الأمامي.
٥. جاري أعمال الحدادة المسلحة للبشة الجزء الخلفي.



٢- الإنتهاء من أعمال العزل المائي بعد الإنتهاء من أعمال الحفر



3- أعمال الحدادة المسلحة للبشة الخزان



مارس ٢٠٢٠



٤- صب الخرسانة المسلحة للبتشة الخزان



0- أعمال الحدادة المسلحة للجزء الخلفى



٦- ضبط جودة الخرسانة



٧- إستمات المهندس الإستشارى بالمشروع





شكراً
