


## متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبي مكة

مايو 2021

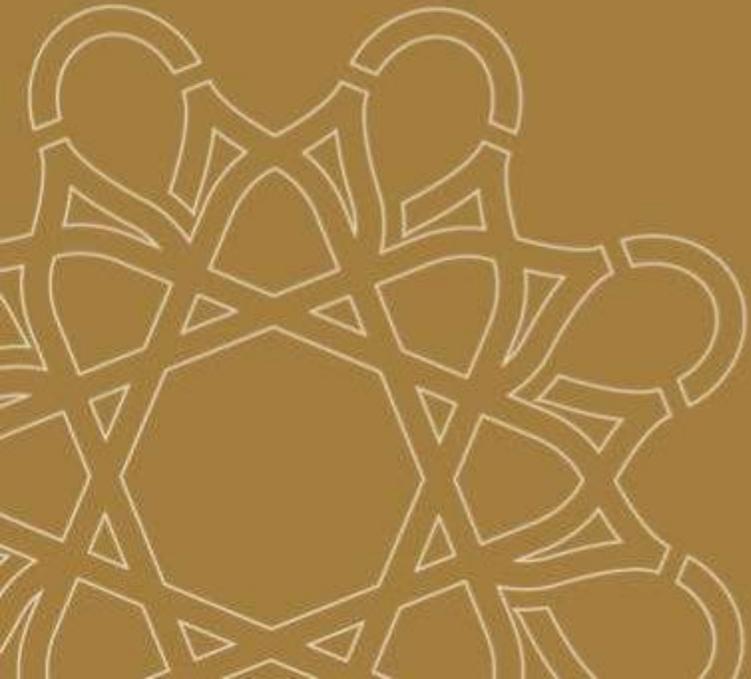



## ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

- صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور المتكرر الخامس عشر
- صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور المتكرر السادس عشر(السقف الأخير)
- أعمال المباني للدور المتكرر الثالث عشر
- أعمال التأسيس لأعمال الإليكتروميكانيك بالدور الثامن والتاسع المتكرر
- تركيب الوحدات الداخلية للتكييف حتى الدور السادس المتكرر
- أعمال اللياسة للدور الثامن والتاسع المتكرر
- أعمال تركيب الأسقف الجبسية بالغرف للدور الخامس والسادس المتكرر
- أعمال عزل لأرضيات الحمامات للدور الخامس المتكرر
- أعمال التأسيس للدهانات للدور الخامس والسادس

# 1- صورة جانبية للمبنى



مايو 2021

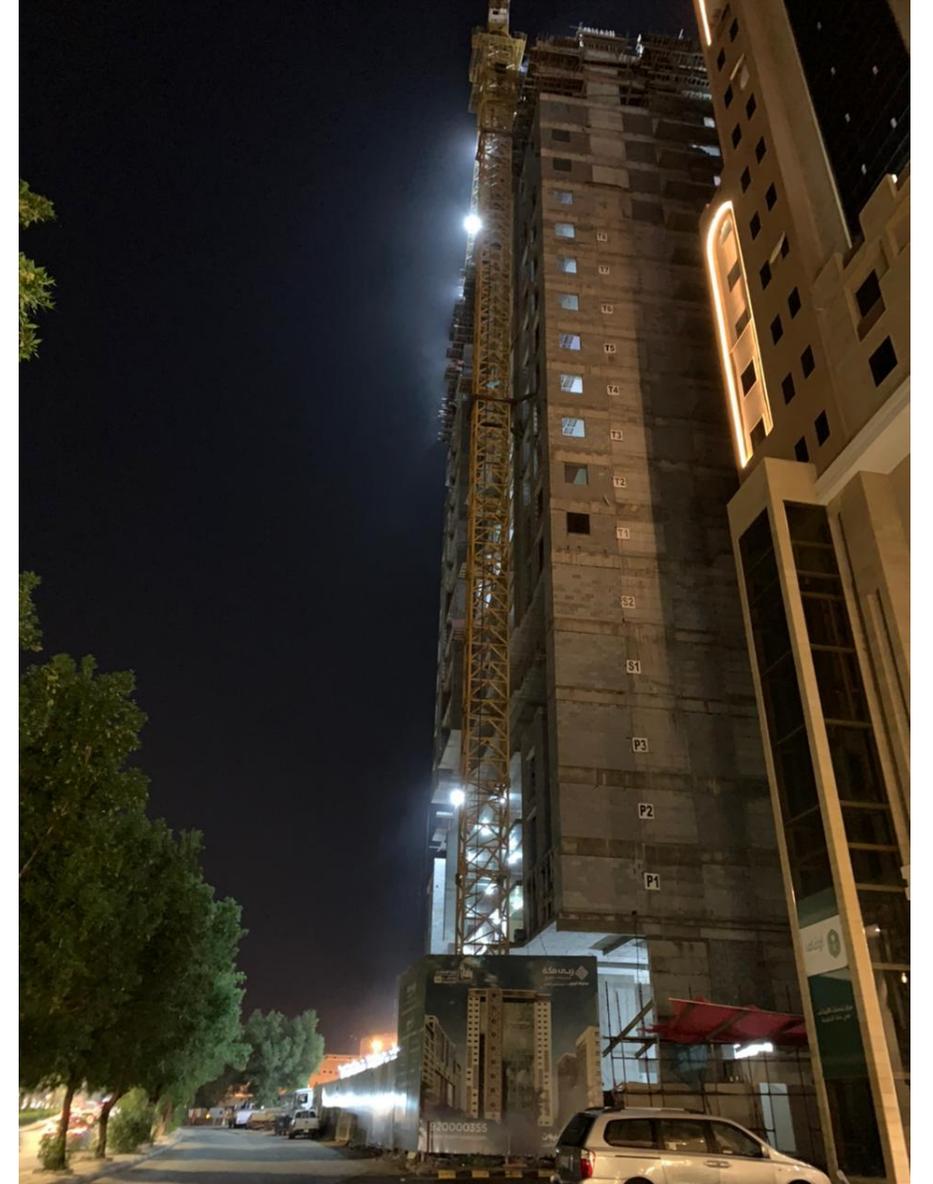

ابريل 2021

## 2- صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور المتكرر الخامس عشر



### 3- أعمال مباني الدور المتكرر الحادي عشر والثاني عشر



## 4- أعمال التأسيس ( كهرباء - صحن - تكييف - مقاومة حريق ) للدور الثامن والتاسع المتكرر



## 5- أعمال تركيب الوحدة الداخلية للتكييف حتى الدور السادس



## 6- أعمال الدهانات للأسقف والحوائط





شكراً
