


متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبي مكة

يوليو 2021

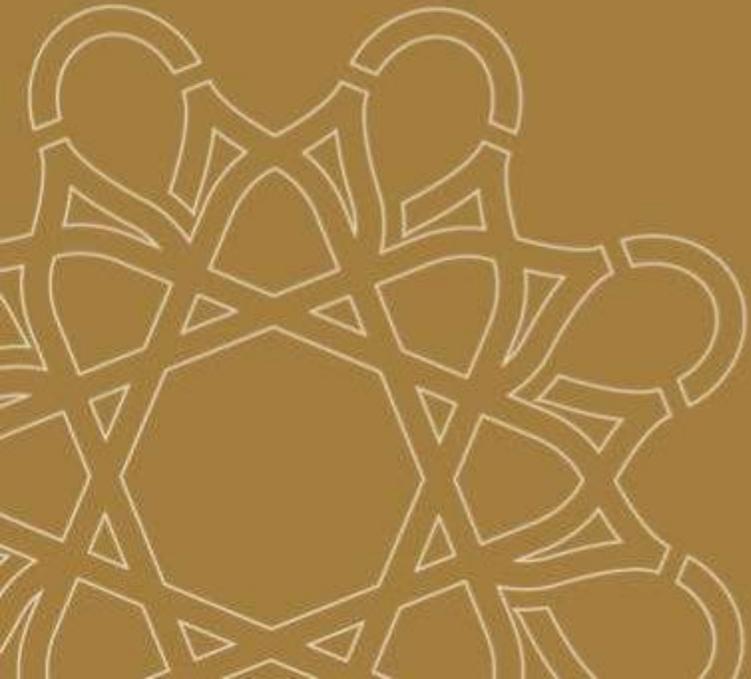

ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

- أعمال مباني الدور 16 (السكنى الأخير) ودور الخدمات الأول والثانى
- أعمال اللياسة للدور الثالث عشر والرابع عشر المتكرر والواجهة الجانبية جهة أبراج التلال
- أعمال عزل لأرضيات الحمامات للدورين الثامن والتاسع المتكرر
- أعمال القواطع الجبسية للدورين الحادى عشر والثانى عشر المتكرر
- أعمال تركيب الأسقف الجبسية بالغرف من للأدوار التاسع والعاشر
- أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات للأدوار السادس والسابع المتكرر
- أعمال تركيب سيراميك أرضيات الغرف للأدوار السادس والسابع والثامن
- أعمال تركيب الدرج من الدور السابع إلى الدور الثانى عشر المتكرر
- أعمال التأسيس للدهانات للدورين الحادى عشر والثانى عشر المتكرر
- أعمال التأسيس لأعمال الإليكتروميكانيك بالأدوار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المتكرر
- البدء بأعمال تجهيزات المصاعد

1- أعمال المباني حتى الدور السادس عشر المتكرر ودروة السطح



مباني دروة السطح



مباني الدور السادس عشر المتكرر

2- أعمال عزل أرضيات الحمامات حتى الدور الثامن المتكرر





3- أعمال تركيب الاسقف الجبسية وتأسيس الدهانات حتى الدور العاشر المتكرر



4- أعمال تركيب سيراميك حوائط وارضيات الحمامات



5- أعمال تركيب الجرانيت لدرج السلالم حتى الدور الثاني عشر المتكرر

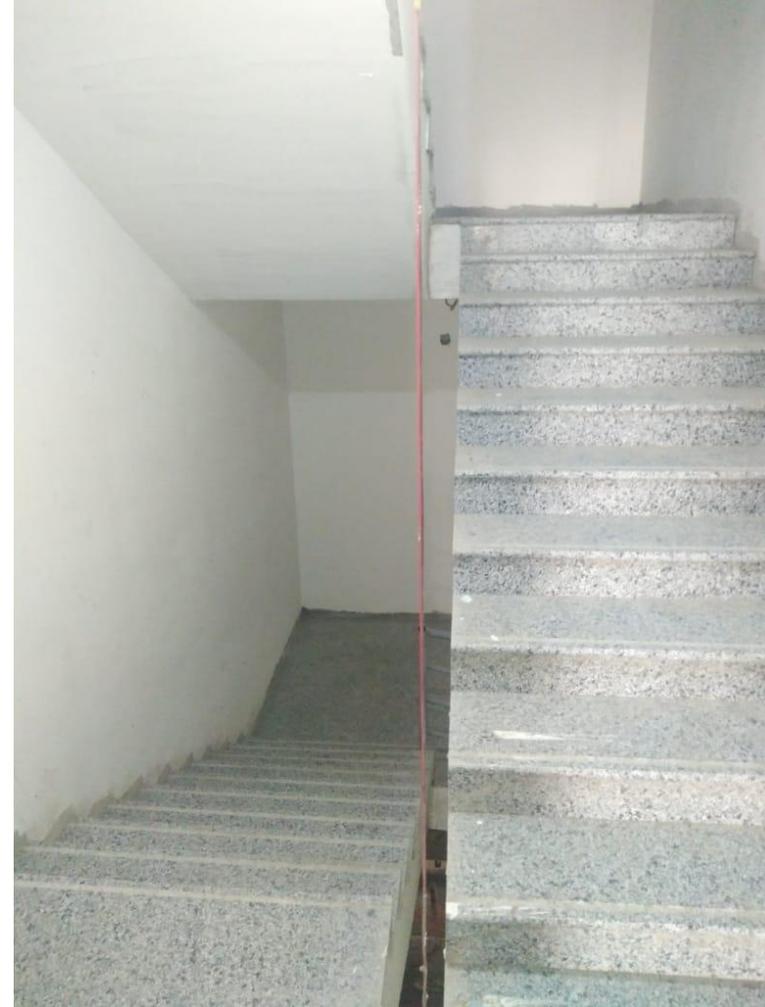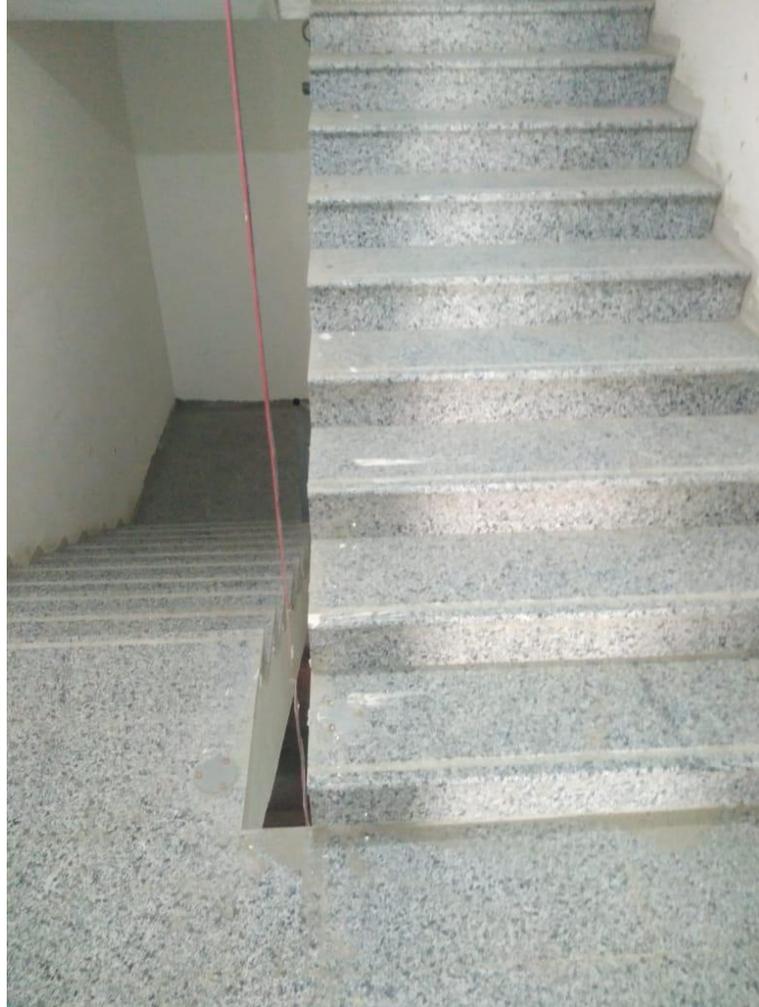

6- تأسيس أعمال الالكتروميكانيك حتى الدور الخامس عشر المتكرر





شكراً
