


## متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبي مكة

أغسطس 2021

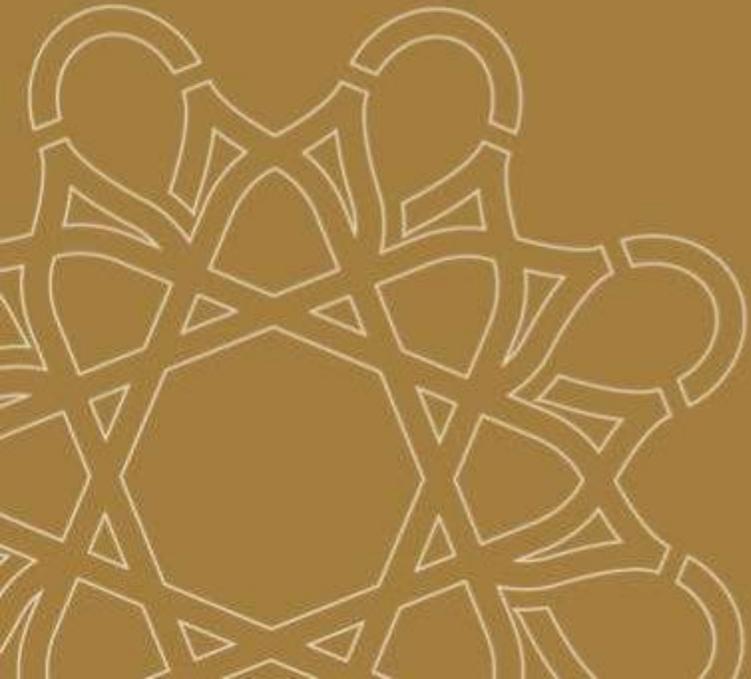

## ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

- أعمال اللياسة للدور الخامس عشر المتكرر والسطح والواجهة الجانبية ناحية برج التلال
- أعمال عزل لأرضيات الحمامات للأدوار 10 و 11 و 12
- أعمال القواطع الجبسية للدورين الثالث عشر والرابع عشر المتكرر
- أعمال تركيب الأسقف الجبسية بالغرف للدورين الحادى عشر والثانى عشر المتكرر
- أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات للأدوار 8 و 9 و 10
- أعمال تركيب سيراميك أرضيات الحمامات للأدوار 6 و 7 و 8
- أعمال تركيب سيراميك أرضيات الغرف للأدوار 9 و 10 و 11
- أعمال الدهانات للدور الثالث عشر المتكرر
- أعمال التأسيس لأعمال الإليكتروميكانيك بالدور السادس عشر
- أعمال مرمى النفايات ومرمى الملابس

# 1- أعمال لياسة الواجهات



أغسطس 2021


## 2- أعمال عزل أرضيات الحمامات حتى الدور الثاني عشر المتكرر



### 3- أعمال القواطع الجبسية للدورين الثالث عشر والرابع عشر المتكرر



## 4- أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمام حتى الدور العاشر المتكرر

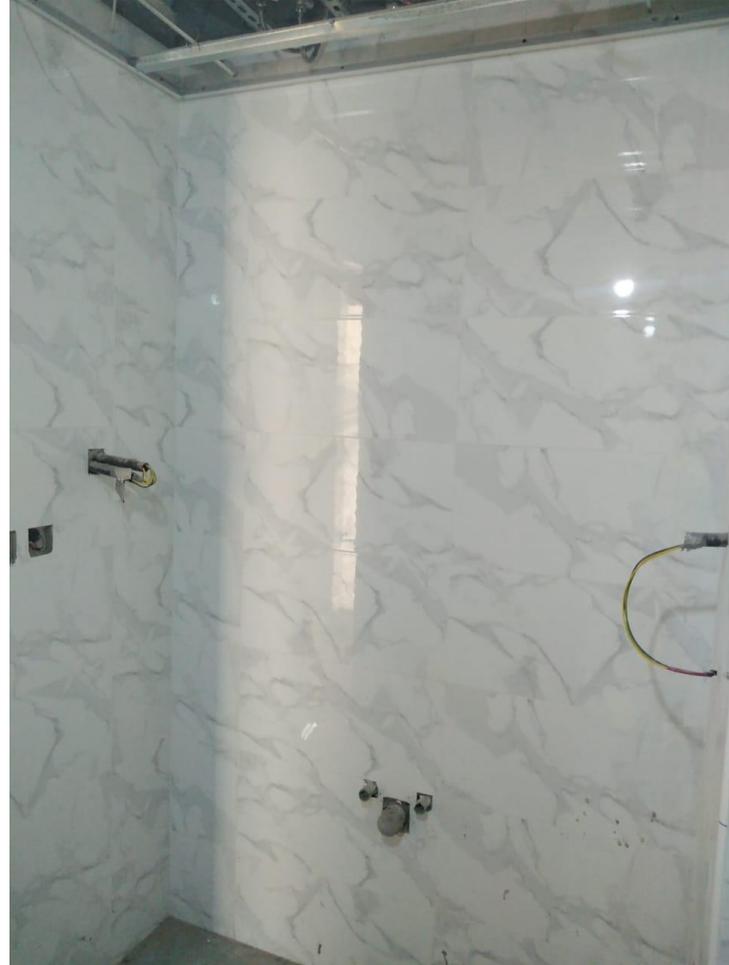

## 5- أعمال تركيب سسيراميك أرضية الحمامات حتى الدور الثامن المتكرر



## 6- أعمال تركيب جرانيت ودرابزين السلالم حتى الدور الحادى عشر المتكرر



## 7- أعمال تركيب ماكينات التكييف حتى الدور الحادي عشر المتكرر



## 8- أعمال تأسيس السباكة والصواعد بالمناور



## 9- أعمال تركيب مرمرى النفايات والملابس





شكراً
