

# متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبى مكة سبتمبر 2021




#### ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر-:


- أعمال اللياسة للدور السادس عشر المتكرر(الدور المتكرر الأخير) والواجهة الجانبية ناحية التلال
  - أعمال عزل لأرضيات الحمامات حتى الدور الثالث عشر
    - اعمال عزل السطح 🗖
  - أعمال تركيب الأسقف الجبسية حتى الدور الثالث عشر المتكرر
  - أعمال تركيب سيراميك حوائط وارضيات الحمامات حتى الدور الثالث عشر المتكرر
    - أعمال تركيب سيراميك أرضيات الحمامات للدورين 9 و 10
    - أعمال تركيب سيراميك أرضيات الغرف حتى الدور الثالث عشر المتكرر
    - أعمال تركيب سيراميك أرضيات الطرقات الرئيسية حتى الدور العاشر المتكرر
      - أعمال تأسيس الدهانات حتى الدور الرابع عشر المتكرر

#### ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر-:

- أعمال دهانات الواجهات الخلفية وناحية الرامب
- ◄ الانتهاء من أعمال الألومنيوم للواجهات الزجاجية
- أعمال نجارة الأبواب ( حلوق حتى الدور الثالث المتكرر)
  - الأعمال المعدنية ( درابزين للأدوار من 1 12)
- ◄ الانتهاء من أعمال تأسيس الالكتروميكانيك(كهرباء وتكييف وصحى )لجميع الأدوار المتكررة

# 1- أعمال لياسة الواجهات ناحية برج التلال

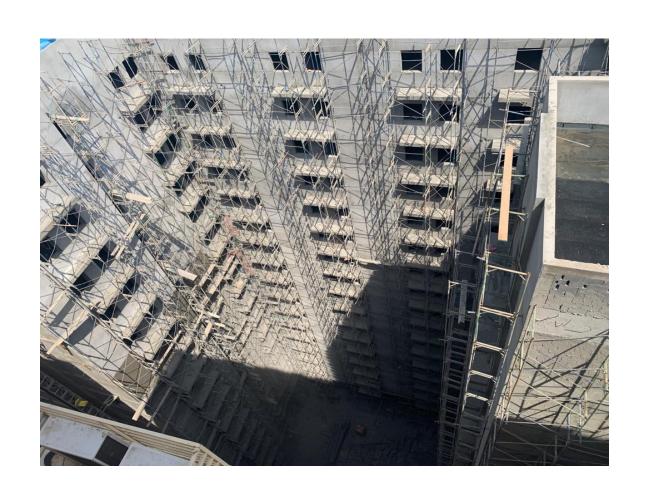

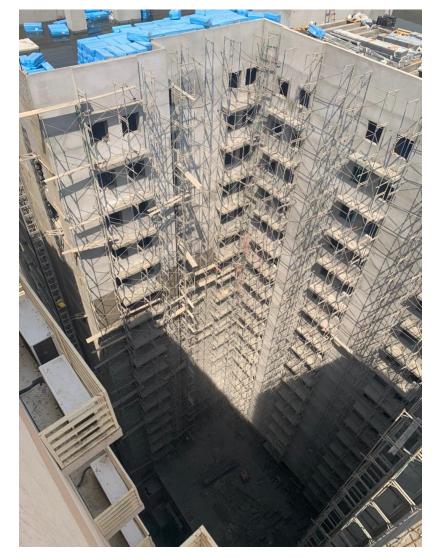

### 4- أعمال الدهانات الخارجية للواجهة الخلفية



### 2- أعمال عزل السطح






## 3- أعمال الأسقف الجبسية للممرات الرئيسية





# 5- أعمال الألومنيوم للواجهات الزجاجية



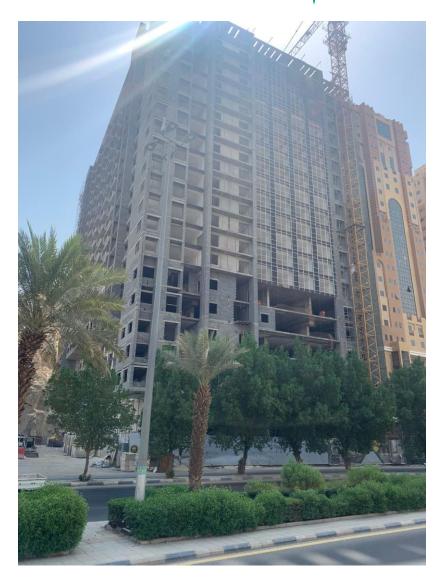

# 7- أعمال تركيب حلوق أبواب الوحدات السكنية



