


متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبي مكة

أكتوبر 2021

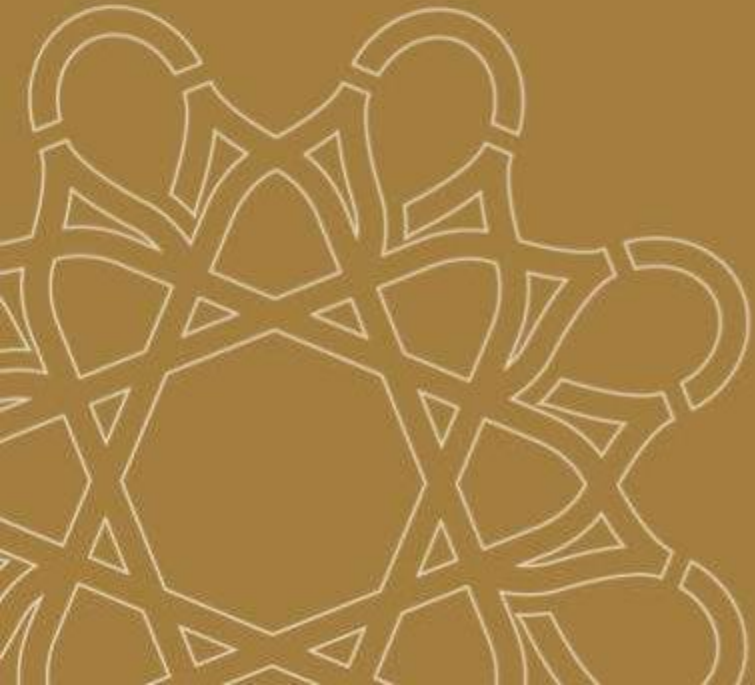

ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

- أعمال اللياسة لأدوار المواقف والواجهة الأمامية والجانبية اليسرى للمبنى
- الانتهاء من أعمال سيراميك أرضيات السطح
- الانتهاء من أعمال القواطيع الجبسية لجميع الأدوار السكنية
- أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات للأدوار 14 و 15
- أعمال تركيب سيراميك أرضيات الغرف للدور 14 وبالممرات للدور 11 و 12
- أعمال تأسيس الدهانات حتى الدور الخامس عشر المتكرر
- أعمال دهانات الواجهة ناحية أبراج التلال
- أعمال شبابيك الألومنيوم (حلق من دور 7 – 16)

تابع ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

- أعمال نجارة الأبواب (حلول للأدوار 4 و 5 و 9 و 10)
- أعمال الكهرباء (تأسيس وتسليك لأدوار المواقف - تمديد كابلات للدور 14 و 15 و 16 -
تشطيب جزئي للأدوار 1 و 2 و 3 و 4)
- أعمال الصحن (تشطيب للأدوار من 1 إلى 6)
- أعمال التكييف (تشطيب للأدوار من 1 إلى 6)
- أعمال مقاومة الحريق (تشطيب للأدوار من 1 إلى 6)

واجهة المشروع



أكتوبر 2021

أعمال الدهانات الخارجية ناحية برج التلال



أكتوبر 2021

أعمال العزل الحرارى للسطح



أكتوبر 2021

أعمال سيراميك ارضيات السطح



أكتوبر 2021

أعمال سيراميك أرضيات الحمامات



أكتوبر 2021

الأسقف الجبسية بالممرات السكنية



أكتوبر 2021



شكراً
